

४.२.४

गण्डकी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
भुम्लीचोक गोरखा

■
■
■
■
■

गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।८०
को
बार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन
२०८०।०५।०६

■
■
■
■
■

गोपी कोइराला, प्रमुख, गाउँपालिका
२

पेश गर्ने:-

गोपी कोइराला
योजना शाखा
गण्डकी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
तोमनडाँडा भुम्लीचोक गोरखा

आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको सम्पन्न प्रतिवेदन

गत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को गण्डकी गाउँपालिका र विषयगत शाखाहरुबाट सम्पादन गरिएका विकास निर्माण लगायत विविध कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा आज मिति २०८०।०५।०६ गतेका दिन गण्डकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक कक्षमा सम्पन्न भयो । गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री दिपक तिमिल्सिना (साकार)ज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा गण्डकी गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न विषयगत शाखाका शाखा प्रमुखज्यूहरुले कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु हुने शाखाहरुको विवरणः

- १) पूर्वाधार तथा भवन नियमन शाखा
- २) स्वास्थ्य शाखा
- ३) शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
- ४) कृषि विकास शाखा
- ५) पशु सेवा शाखा
- ६) महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा
- ७) पन्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा
- ८) राजश्व शाखा
- ९) आर्थिक प्रशासन शाखा
- १०) प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा
- ११) योजना शाखा

उक्त समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण अनुसार गत आ.व. २०७९।०८० को अवधिमा कुल आय रु. ६०४४६४३८५ मध्ये रु. ५५३०८११९६ अर्थात कुल आयको ७८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको विवरण प्रस्तुत भएको थियो ।

विषय क्षेत्रगत रुपमा देहाय बमोजिम प्रगति हासिल भएको देखिन्छ ।

१) आर्थिक विकास	२६.०१ प्रतिशत
२) सामाजिक विकास	९२.५४ प्रतिशत
३) पूर्वाधार विकास	६९.५५ प्रतिशत
४) सुशासन तथा संस्थागत	७४.४ प्रतिशत


५) कार्यालय सन्चालन तथा प्रशासनिक ८०.९

यसै गरी विषयगत शाखा तर्फको वित्तिय प्रगति विवरण तपसिल बमोजिम रहेको देखिन्छ ।

१) स्वास्थ्य तर्फ	८८.९८
२) शिक्षा तर्फ	९६.२८
३) कृषि तर्फ	२६.९४
४) पशु सेवा तर्फ	३६.६०
५) महिला तथा बालबालिका तर्फ	.
६) प्रधानमन्त्री रोजगार तर्फ	९३.१७
७) पर्यटन तर्फ	९६.१७








उक्त समीक्षा कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादन भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु समेत प्रस्तुत गरिएको थियो, जो यस प्रकार रहेको छ ।:

- १) अनलाइन सिस्टमबाट योजना तथा राजश्व अभिलेखीकरण हुने गरेको
- २) ड्रोन सिसिटिभी जस्ता उच्च प्रविधिको उपयोग गरिएको
- ३) दिगो विकासमा जोड दिदै गौरवका योजनाहरु कार्यान्वयनमा आएको
- ४) शिक्षक दरवन्दी मिलान र विद्यालय समायोजन अघि बढाइएको,
- ५) पशु स्वास्थ्य शिविरहरु सन्चालनमा ल्याइएको,


प्रतिवेदक
गोपी कोइराला
सहायक पाचौ
गण्डकी गाउँपालिका भुम्तीचोक


आज मिति २०८०।०५।०६ गतेका दिन गण्डकी गाउँपालिकाको आ.व. आ.व. २०७९।८० को योजना तथा कार्यक्रमहरूको (वित्तीय तथा भौतिक) वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री दिपक तिमिल्सिना (साकार) ज्यूको अध्यक्षतामा गण्डकी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको सभाहलमा सन्चालन हुदाको उपस्थिति र निर्णय देहाय बमोजिम रहेको छ ।

उपस्थिति

क्र.स.	पदाधिकारीज्यूहरूको नाम वर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री दिपक तिमिल्सिना (साकार)	गाउँपालिका अध्यक्ष	
२	श्री ललिता अधिकारी	गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
३	श्री रिजेश उपरकोटी	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	श्री तोप मान गुरुङ	वडा अध्यक्ष वडा नं. १	
५	श्री यम बहादुर थापा	वडा अध्यक्ष वडा नं. २	
६	श्री सुवास पन्त	वडा अध्यक्ष वडा नं. ३	
७	श्री राजुवावु भण्डारी	वडा अध्यक्ष वडा नं. ४	
८	श्री पहलमान वयलकोटी	वडा अध्यक्ष वडा नं. ५	
९	श्री तुल बहादुर गुरुङ	वडा अध्यक्ष वडा नं. ६	
१०	श्री तुलसी रेग्मी	वडा अध्यक्ष वडा नं. ७	
११	श्री कोकिल बहादुर पुलामी मगर	वडा अध्यक्ष वडा नं. ८	
१२	श्री सिताराम विश्वकर्मा	कार्यपालिका सदस्य	
१३	श्री अ माया राना	कार्यपालिका सदस्य	
१४	श्री कुन्ति माया प्रजा	कार्यपालिका सदस्य	
१५	श्री तारा परियार	कार्यपालिका सदस्य	
१६	श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ	कार्यपालिका सदस्य	
१७	श्री लक्ष्मी वाग्दस	कार्यपालिका सदस्य	

कर्मचारीहरुको नाम घर	पद	हस्ताक्षर
श्री सुदिप पन्थ	शिक्षा अधिकृत (सातौ)	
श्री दिलिप खाँण	इन्जिनियर (सातौ)	
श्री मिलन नेपाली	ईन्जिनियर	
श्री कुमार सुनार	जन स्वास्थ्य निरीक्षक (स्वास्थ्य शाखा प्रमुख)	
श्री विमल रेग्मी	जन स्वास्थ्य निरीक्षक	
श्री मुकुन्द न्यौपाने	सूचना तथा प्रविधि अधिकृत	
श्री लक्ष्मण रेग्मी	रोजगार संयोजक	
श्री एन्जिला देवकोटा	कृषि स्नातक प्राविधिक	
श्री जिवन गुरुङ्ग	स्व. सचिव गा.पा. अध्यक्ष	
श्री गोपी कोइराला	योजना शाखा प्रमुख	
श्री सुकमाया राना मगर	महिला विकास निरीक्षक	
श्री तोरण देवी गुरुङ्ग	सब इन्जिनियर	
श्री भिन कुमार महत	पशु सेवा शाखा प्रमुख	
श्री ऋचा देवकोटा	कृषि शाखा	
श्री वविस मगर	प्राविधिक सहायक	
श्री सन्तोष विश्वकर्मा	सहायक रोजगार संयोजक	
श्री सागर शर्मा	लेखा सहायक	
श्री विकास चेपाङ्ग	पंजिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा	
श्री महेन्द्र खत्री	सहायक निरीक्षक उद्यम विकास लक्ष्मण	
श्री शेखर बाबु श्रेष्ठ	अ.सब इन्जिनियर	
श्री प्रेम बहादुर उपरकोटी	अभिन शाखा	
श्री शर्मिला चेपाङ्ग	पोषण सुरक्षा शाखा	
श्री सुमिला देवकोटा	पशु सेवा शाखा	
श्री गजेन्द्र त्रिपाठी	शिक्षा शाखा	

1
उँपालिकामा आ.व. २०७९/०८० को अवधिमा सन्चालन भएका विभिन्न विषयगत शाखा अन्तर्गतका १ कार्यक्रमहरुको वार्षिक कार्यसम्पादनको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण तथा चालु आ.व २०८०/०८१ जना विभिन्न विषयगत शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि कर्मचारीहरुबाट प्रस्तुत भई समिक्षात्मक रुपमा भयो । समीक्षा कार्यक्रममा तपसिल बमोजिम विषयगत शाखाहरुबाट प्रगति तथा कार्ययोजना प्रतिवेदन जानकारी भयो । साथै समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रगति प्रतिवेदन तथा कार्ययोजना सहित संलग्न त प्रतिवेदन तयार गरी कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।



गण्डकी गाउँपालिकाको आफ्नै लोगो

पालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०७९।१०।२५



गण्डकी गाउँपालिकाको
आ.व. २०७९।०८० को
वार्षिक प्रगति विवरण

प्रस्तुती:

गोपी कोइराला

योजना शाखा प्रमुख



१. परिचय

• गण्डकी गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति:

गण्डकी गाउँपालिका क्षेत्र २७ डिग्री ४७ मिनेट ४३ सेकेन्डदेखि २७ डिग्री ५५ मिनेट ४० सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र ८४ डिग्री ३८ मिनेट ६ सेकेन्ड पूर्वदेखि ४७ मिनेट ४ सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। यस गाउँपालिकाले मध्य पहाडी क्षेत्रको नदी तटिय बेसी देखि महाभारत पर्वतको सेरोफेरोलाई समेटेको छ। गाउँपालिका समुद्र सतहको २७० मिटर देखि १७१० मिटर उचाइसम्मको अवस्थित रहेको छ। महाभारत पर्वतीय श्रृंखलाको नदी तटिय आधार क्षेत्र देखि पहाडको माथिल्लो भागसम्म यस क्षेत्रले ओगटेको छ। समथर फाँट तथा माथिल्लो क्षेत्रमा आंशिक भिरालो र केही स्थलमा चट्टानी क्षेत्र रहेको यस गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित रहेको छ।

• गाउँपालिकाको सिमाना:

पूर्वमा - धादिङ जिल्लाको ज्वालामूखी गाउँपालिका तथा सिद्धलेक गाउँपालिका
पश्चिममा - चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका
उत्तरमा - गोरखा जिल्लाको शहिद लखन गाउँपालिका
दक्षिणमा - धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका

गाउँपालिकाको जनसंख्या:

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल घरधुरी संख्या ५६५९, महिला १११०५ पुरुष १०२८९ जम्मा जनसंख्या २१३९४ रहेको छ । गाउँपालिकामा पुरुष ४८.१ प्रतिशत र महिला ५१.९ प्रतिशत रहेको छ ।

गाउँपालिकाको प्रशासनिक विभाजन:

साविक फुजेल, दर्बुङ, भुम्लिचोक, घ्याल्चोक, ताडलीचोक र मकैसिङ गा.वि.स मिलेर वि.सं २०७३ साल फाल्गुन २७ मा गण्डकी गाउँपालिकाको गठन भएको छ । यस गाउँपालिकालाई कुल ८ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको क्षेत्रफल:


यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १२३.९४ वर्ग कि.मि रहेको छ ।

प्रशासनिक केन्द्र:


गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं.६ को भुम्लिचोक कायम गरिएको छ ।

२.जनशक्ति विवरण:

विवरण	जम्मा दरवन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
गाउँपालिका तर्फ	३८	२३	१५
वडा कार्यालय तर्फ	२४	१९	५
स्वास्थ्य तर्फ	७२	५६	१६
कृषि तथा पशु विकास शाखा	१३	९	४
अन्य(मेडपा,प्रधानमन्त्री रोजगार,पञ्जिकरण आदी)	८	८	०
जम्मा	१५५	११५	४०



कुल खर्च वजेट:
५५३०८११९५।०७

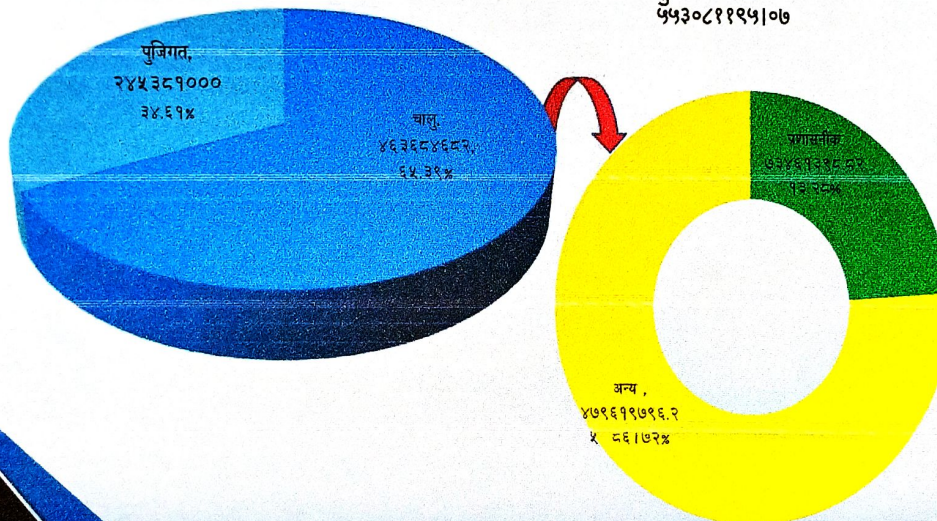

विषय क्षेत्रगत वजेट तथा खर्च विवरण

क्र.स	विषय क्षेत्र शीर्षक	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	आर्थिक विकास	५८८३३०००	१५३००२२७।६७	२६।०९	
२	सामाजिक विकास	३२०७२७१६२	२९६७९६१९२	९२।५४	
३	पूर्वाधार विकास	२०७७६७०००	१४४५०८०८४।२१	६९।५५	
४	सुशासन तथा सस्थागत विकास	३०९३६०००	२३०१५२९१।७१	७४।४	
५	कार्यलय सन्चालन तथा प्रशासनिक खर्च	९०८०२५२०	७३४६१३९८।८२	८०।९	
	जम्मा	७०९०६५६८२	५५३०८११९५।०७	७८	

विषय क्षेत्रगत वजेट तथा खर्च विवरण

क्र.स	विषय क्षेत्र	कुल वजेट	कुल खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	स्वास्थ्य	४३९१००००	३९०७०४९२	८८.९८	९०	
२	शिक्षा	२०६९९८०००	१९९२९८४३१.१६	९६.२८	१००	
३	कृषि	१३५०००००	३६३७२६.९२	२६.९४		
४	पशु	८०५००००	२९४६३५७.४५	३६.६०	४०	
५	महिला तथा बालबालिका	१५०००००	११			
६	रोजगार	११९०००००	१११३०५३५.५१	९३.५३	९४	
७	पर्यटन	८०००००	७६९३९८.०७	९६.१७	१००	

श्रोतगत वजेट र खर्च विवरण

ક્ર.સ	શ્રોતગત વિવરણ	બજેટ	નિકાસા	સ્વર્ચ	પ્રગતિ
૧	સંઘીય સમાવીકરણ અનુદાન	૧૪૯૧૦૦૦૦૦	૧૧,૩૦૦૦૦૦૦	૧૧૭૩૨૪૩૮૬	૭૮.૬૧%
૨	સંઘીય સસત અનુદાન	૨૯૩૩૬૭૦૦૦	૨૬૧૮૯૧૪૪૪.૪૮	૨૬૧૮૯૧૪૪૪.૪૮	૮૯.૩૭%
૩	સંઘીય સમપુરક અનુદાન	૮૦૦૦૦૦૦	૬૦૧૯૯૪૪	૬૦૧૯૯૪૪	૭૫.૨૫%
૪	સંઘીય રાજસ્વ વોડફાંડ	૮૯૬૦૧૦૦૦	૪૪૦૦૦૦૦૦	૩૪૧૭૬૯૪૦.૭૧	૩૯.૨૬%
૫	સંઘીય વિશેષ અનુદાન	૨૬૬૦૦૦૦૦	૧૮૪૯૩૧૩૬.૨૫	૧૮૪૯૩૧૩૬.૨૫	૬૯.૫૨%
૬	પ્રદેશ સમાવીકરણ અનુદાન	૧૮૨૪૯૦૦૦	૧૪૦૪૬૭૫૦	૧૦૭૪૪૨૦૮.૮૭	૫૮.૮૪%
૭	પ્રદેશ સમપુરક અનુદાન	૮૦૦૦,૦૦૦	૪૪૧૩૦૦૦	૪૪૧૩૦૦૦	૬૭.૬૬%
૮	પ્રદેશ વિશેષ અનુદાન	૦	૦	૦	૦%
૯	પ્રદેશ સસત અનુદાન	૪૦,૦૦,૦૦૦	૪૯૯૯૯૯૯.૯૯	૪૯૯૯૯૯૯.૯૯	૧૦૦%
૧૦	પ્રદેશ રાજસ્વ વોડફાંડ	૭૨૩૪૦૦૦.૦૦	૬૧૦૦૦૦૦.૦૦	૩૨૯૭૯૭૭.૭૦	૪૫.૫૮%
૧૧	આન્તરિક શ્રોત	૧૦૩૪૦૪૬૮૨	૧૦૦૫૦૦૦૦૦	૮૯૭૨૦૦૪૫.૮૯	૮૬.૭૭%
૧૨	વિવિધ	૫૦૦૦૦૦	૦	૦	૦%
	જમ્મા	૭૦૯,૦૬૪,૬૮૨	૬૦૪,૪૬૪,૩૮૫.૭૨	૫૪૩,૦૮૧,૧૯૬	૭૮%

सघीय सम्पुरक योजना

[illegible]

क्रमशः

क्र.स.	आयोजनाको नाम	डेक्रेटार / उद्योगी अवस्था		आयोजनाको सामान विवरण				सम्पद		संकोता मिति	पेशकी रकम	साथमा न हुने मिति	उपलब्धी । पुरानो		सापेक्षत जनसंख्या	आयोजनाको मुल्यांकन अंक कुल	आयोजनाको बाध रकम कुल	यो आ.व.क बाध रकम	गति क प्रतिशत	वित्तिय पुरतिशत	कि.
		नाम	सम्पद न	कुल सापेक्ष अंक	डेक्रेट विनियोजन अंक	डेक्रेट कुल अंक	०.७५।०.८० को विनियोजन वजेद	विवरण	परिमाण				विवरण	उपलब्धी							
	विश्वविद्यालय शिक्षण केन्द्र, काठमाडौं	१८/११/१९९१	१९९६/१९९७	१६००००००	१२५९२११.२९	१६००००००	सहक सरोवरी सापेक्षना पक्षी नासा हनुमान पक्षी दलान	१.५ कि.मी २० बा १०३० मी १५ बा ३०० मि.	०.७५।०.८०	२००००००	२०८०.२.३७	सहक सरोवरी सापेक्षना पक्षी नासा हनुमान पक्षी दलान	१.५ कि.मी २० बा १०३० मी १५ बा २५० मि.	५०००	१२३५९७७७.९	१२३५९७७७.९	१२३५९७७७.९	९८.४९%	९८.४९%		

प्रदेश शसर्त

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	डेकदार / उद्योग कायदा	आयोजनाको नाम		वार्षिक सव्य	संशोधन मिति	समयन हुने मिति	वार्षिक उपसव्य	वा. जनसंख्या	आयोजनाको मूल्यांकन अंक	आयोजनाको भूकानी अंक	निरीक्षण प्रमाण प्रतिभार	कै		
			नाम	समयकै नं.										निर्दिष्ट वास्तव अनुदान	कुल लागत
1	वडा नं ७ युलिङ्ग देखी चिन्नेटी	वाइ पी इन्जिनियरिङ्ग एण्ड क प्राप्ति	९८५७०६५५१३	५००००००	७४८६.१६९	5078०87.41	५०० मि पक्की नाला, ५८ थान ग्याबिन जाली, १० र.मि ह्युम पाइप, १५० मि पक्की ढलान, २० मि पक्की cause way, ३०० मि पहिरो साफा र extra widening	०79.8.14	०8०.2.17	४१० मि पक्की नाला, ५९ थान ग्याबिन जाली, १० र.मि ह्युम पाइप, १५३ मि पक्की ढलान, २७.५४ मि पक्की cause way, ३०० मि पहिरो साफा र extra widening	3500	५०२७२४०	५०२७२४०	98.99 %	98.99 %

गण्डकी गाउँपालिकाको बेरुजु अवस्था

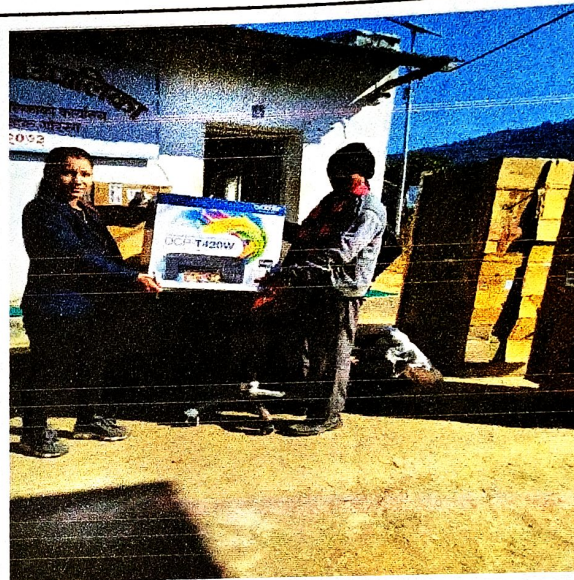
- आ व २०७७।०७८ सम्मको कुल बेरुजु रकम ७२९३३०००
- आ व २०७८।०७९ को कुल बेरुजु रकम ९८६००००
- हालसम्मको कुल बेरुजु अङ्क रु ८२७९३०००
- आ व २०७९।८० को डोर आइ नपुगेको

५. प्रमुख उपलब्धीहरु:

- अनलाइन सिष्टमवाट योजना अभिलेखिकरण तथा राजश्व सकलन र प्रतिवेदन तयार हुने गरेको ।
- ड्रोन र सिसिटिभी जस्ता प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी योजनाहरुको अनुगमन समेत गर्ने गरिएको ।
- दिगो विकासमा जोड दिदै गौरवका ठुला आयोजनाहरुको सफल कार्यन्वयन गरिनु ।
- विद्यालय मर्च गरी शिक्षक दर्वन्दी मिलान र सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार ।
- भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यलयको समन्वयमा परजिवि नियन्त्रण तथा वाइजोपन निवारण सिविर सन्चालन सम्पन्न

जिल्ला समन्वय समितिसँग राखिएका अपेक्षाहरु

- नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच पुलको रूपमा रही जिल्ला समन्वय समितिले विकास निर्माण लगायतका कार्यहरुमा समन्वयकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने।
- नेपालको संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरेको समन्वय र अनुगमनको कार्य प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका विकास निर्माण कार्यहरुको अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन मन्त्रालय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनु पर्ने।
- स्थानीय तह बीचको समन्वयात्मक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने।






12/29/2023




सत्यदेवी मन्दिर, फुजेल



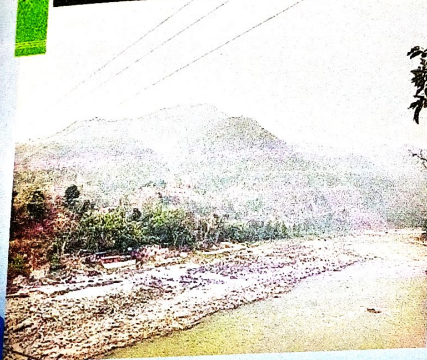महादेवडाडा, ताडलीचोक



राफ्टीङ क्षेत्र





दक्षिण एसियाको ठुलो समीको रुख, गण्डकी गा.पा-३, फुजेल



मुन्थला मन्दिर, गण्डकी गा.पा-८, घ्याल्चोक

बजेट	विनियोजित बजेट	निकासा बजेट	बजेट खच (%)	जम्मा (आ.व. २०७८/७९)	आ.व. २०७९/८० मा फर्छ्यौट %
पर्यटन अनुदान	४३३३००००/-	३८१४७४९२	९२.३ %	०	०
सामानिकरण अनुदान गा.पा	२५,००,०००/-	८,५०,०००/-	३४%	०	०
विशेष अनुदान	८३,००,०००/-	७८,९१,२०३/-	९५.१%	०	०



.....Rural/Municipality

गण्डकी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, भुम्लीचोक
गोरखा



भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजनाहरूको (पूँजिगत)
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

प्रतिवेदन पेश गर्ने
योजना, भौतिक पूर्वाधार
तथा
भवन नियमन शाखा

यस भित्र

- १) प्रगति विवरण साराँश
- २) संघीय सरकार समपुरक क्रमागत योजना प्रगति विवरण
- ३) संघीय सरकार समपुरक आवधिक योजना प्रगति विवरण
- ४) प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान योजना प्रगति विवरण
- ५) प्रदेश शसर्त अनुदान योजना प्रगति विवरण
- ६) सडक बोर्ड नेपाल र पालिका समपुरक अनुदान योजना प्रगति विवरण
- ७) गाउँपालिकास्तरका योजनाहरुको प्रगति विवरण
- ८) वडास्तरीय योजनाहरुको प्रगति विवरण
- ९) उपलब्धीहरु, समस्या र चुनौतीहरु
- १०) उपलब्धी भलकहरु

आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रगति सारांश विवरण प्रतिशतमा

गण्डकी गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७९।८० मा कार्यान्वयन भएका पूजिगत तर्फका योजनाहरुको सम्पन्न वित्तिय तथा भौतिक प्रगति प्रतिशत विवरण सारांशमा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

क.स.	कार्यक्रम विवरण	प्रगति प्रतिशतमा		कैफियत
		वित्तिय प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	
१	संघीय सरकार समपुरक कमागत	७६.६३ %	७६.६३%	
२	संघीय सरकार समपुरक आवधिक	९८.४९ %	९८.४९ %	
३	प्रदेश सरकार समपुरक	९८.८४ %	९८.८४ %	
४	प्रदेश सरकार शसर्त	९८.९९ %	९८.९९ %	
५	सडक बोर्ड नेपाल र पालिका साभेदारी	०.० %	८९.६० %	
६	गाउँपालिका स्तरका योजना	६७.१० %	६७.७१ %	
७	वडास्तरीय योजना	९३.२० %	९६.५० %	



आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सघीय सम्पूरक अन्तर्गतको आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित संघीय समपुरक अन्तर्गतको आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण																					
क्र.सं.	आयोजनाको नाम	डेक्का / उभोड आयुक्त		आयोजनाको लागत विवरण				तथ्य		संशोधा मिति	पैकी रकम	सम्पन्न हुने मिति	उपलब्धी / प्रगति		सामान्वित जनसंख्या	आयोजना को मूल्यांकन अंक कुल	आयोजनाको खर्च रकम कुल	यो आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
		नाम	सम्पन्न नं.	कुल लागत अंक	कुल विनियोजित बजेट	डेक्का कबोल अंक	०७९/८० को विनियोजित बजेट	विवरण	परिमाण				विवरण	उपलब्धी							
	आर्थीढोडा दलभन्ज्याग रातीरबोरा कोटी चौला हटिया कुलायानी बलासे भन्ज्याग सडक/आर्थीढोडा दलभन्ज्याग फेज १)	सिन्धुली, हिम जेभी	१८५६०२७३१७	१९९६३९३१.३२	१९९६३९३१	८१५९२०८.५७	४०६०००००	सडक स्तरोन्नती वेसकोर्त ग्याबियनवाल मेशिनरीवाल पक्की नाला हयुमपाईप कालोपत्रे कजरे	३.५ कि.मी ३.५०कि.मी १९७६.५ घ.मी १९३४.५ घमी ३.५ कि.मी ८२.५ मि. ३.५ कि.मी १ गोटा	०७७.३.१	१२७००००० पैकी फर्चौट भएको	०८०.६.३०	सडक स्तरोन्नती वेसकोर्त ग्याबियनवाल मेशिनरीवाल पक्की नाला हयुमपाईप कालोपत्रे कजरे	३.५ कि.मी ३.५ कि.मी १९७६.५घ.मी १९३४.५ घ ३.५ कि.मी ८२.५ मि ० कि.मी १ गोटा	५०००	६२४९७२५९.७२	६२४९७२५९.७२	२०९३३६५.८	७६.६३%	७६.६३%	खर्च र मूल्यांकन कन्टिन्जेन्सी बाहेक घातु आव को खर्च कन्टिन्जेन्सी समेत

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

रिजेश उपरकोटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	डिजाइन / उद्देश्य	आयोजनाको लागत विवरण			सम्पन्न हुने मिति		सम्पन्न हुने मिति	उपलब्धी । प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या	आयोजना को मूल्यांकन अंक कुल	आयोजनाको खर्च रकम कुल	यो आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	टिप्पणी
			कुल लागत अंक	कुल विनियोजित बजेट	डिजाइन अंक	विवरण	परिमाण		विवरण	उपलब्धी							
१	मिर्लिङ्ग देवि भैरवी चौमम्मको बाटो	बाटो १५ मी चौमम्मको बाटो	९८५०६५९३	९९६३९३९.३२	९९००००००	१२५४९२९९.२९	१६००००००	०७९.०८.१४	सडक स्तरोन्नती म्याथियन वाल पक्की नाला हनुम पाइप पक्की ढलान	१.५ कि.मी २७ धान १२३० मी १५ धान ३०० मि	२०८०.२.१७	२००००००	१२३५९७७७.९	१२३५९७७७.९	९८.४९%	९८.४९%	

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

रिजेश उपरकोटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चालित योजनाहरूको प्रगति विवरण (प्रदेश सम्पुरक)

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चालित योजनाहरूको प्रगति विवरण (प्रदेश समपुरक)																
क्र.सं.	आयोजनाको नाम	हेक्टर / उधोस अध्याक्ष		आयोजनाको लागत				वार्षिक लक्ष्य मुख्य कार्यको गण्डकी नदीको कार्यपालिकाको मोनखा भूमिचित्रको मोनखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३	सम्पन्न हुने मिति	ला. जनसंख्या	आयोजनाको मूल्यांकन अंक	आयोजनाको भुक्तानी अंक	कार्य उपलब्धी	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	
		नाम	सम्पर्क नं.	विनियोजित अनुदान			कुल लागत अंक									ठेक्का कवोल अंक (कन्टिन्जेन्सी बाहेक)
				प्रदेश	गाउँपालिका	जम्मा										
१	मकैसि लामागाउँ एना पहाड दलभन्ज्याङ गाउँपालिका सडक	वाइ पि निर्माण सेवा	९८५७०६५५९३	८००००००	५४००००००	१३४००००००	१८०६०३९९.५७	८८९१७५२.३७	०७८.९.११	०७९.३.१०	३५००	८७८८३६२.४२	८७८८३६२.४२	सडक नयाँ ट्याक खोल्ने कार्य ५९५ मि ब्रेष्टवाल ६३ मि. र ग्यावियन वाल २७९ वक्स	९८.८४%	९८.८४%
	जम्मा			८०००००००	५४०००००००	१३४०००००००	१८०६०३९९.६	८८९१७५२.३७	०७८.९.१२	०७९.३.११	३५००	८७८८३६२.४२	८७८८३६२.४२		९८.८४%	९८.८४%


तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

रिजेश उपरकोटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालन भई आ.व. ०७९।८० मा भुक्तानी भएको योजनाहरूको प्रगति विवरण (प्रदेश शसत)



क.स.	आयोजनाको नाम	ठेकेदार / उभोस अध्यक्ष		आयोजनाको लागत			वार्षिक लक्ष्य	सम्पन्न हुने मिति	वार्षिक उपलब्धी	ला. जनसंख्या	आयोजनाको मूल्यांकन अंक	आयोजनाको भुक्तानी अंक	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	कै
		नाम	सम्पर्क नं.	विनियोजित अनुदान	कुल लागत	ठेक्का कबोल अक कन्टिन्जेन्सी बाहेक								
१	बडा न ७ चुर्लिङ देखी चिप्लेटी	बाइ पी इन्जिनियरीङ्ग एण्ड क प्रावि	९८५७०६५५१३	५००००००	७४८६१६९	५०७८०८७३४९	५०० मि पक्की नाला,५८ थान ग्याबिन जाली,१० रामि ह्युम पाइप, १५० मि पक्की ढलान, २० मि पक्की cause way, ३०० मि पहिरो साफा र extra widening	०७९.८.१४	०८०.२.१७	३५००	५०२७२४०	५०२७२४०	९८.९९%	९८.९९%

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने

रिजेश उपरकोटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालित सडक बोर्ड नेपाल र गाउँपालिका साभेदारी तर्फका योजनाहरुको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	हेर्केदार / उभोस बन्धन		आयोजनाको लागत			वार्षिक लक्ष्य	आयोजनाको मूल्यांकन अंक	आयोजनाको भुक्तानी अंक	कार्य उपलब्धी	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कै
		नाम	सम्पर्क नं.	विनियोजित अनुदान	समाधान	कुल लागत अंक							
१	दलभन्ज्याङ बुटार सडक मर्मत	जुनी प्रजा बेपाङ	९८३३८९७३	१०००००	१२४४६४३	६२४४६४३	१.५*१*१ को ३५ ग्यावियन, २*१*१ को २८ थान ग्यावियन वक्स भरेको	६२४०६८९६	०	१.५*१*१ को ३५ थान ग्यावियन, २*१*१ को २८ थान ग्यावियन वक्स भरेको	०%	९९.७६%	
२	भालडाँडा याङ्दी सडक	याम बहादुर थापा	९८०३८०९	१०००००	१२४४६४३	६२४४६४३	१.५*१*१ को २४ थान ग्यावियन, २*१*१ को ३६ थान ग्यावियन वक्स भरेको	९३०	६२४३६८४९	१.५*१*१ को २४ थान ग्यावियन, २*१*१ को ३६ थान ग्यावियन वक्स भरेको	०%	१००%	
३	सानो दर्वुङ्ग तोलक सडक	सोम एण्ड अयर कन्स्ट्रक्शन	०	६२४७४८९	०	६२४७४८९	१.५*१*१ को ३१ थान ग्यावियन, २*१*१ को २१ थान ग्यावियन वक्स भरेको	५००	५७८७४७३	१.५*१*१ को ३१ थान ग्यावियन, २*१*१ को २१ थान ग्यावियन वक्स भरेको	०%	९२%	
४	देवीथान मुनिको वालकी पहिरो नियन्त्रण			५०००००	०								
	जम्मा			२५४०६	२४१११३	२५४०६	०	१५००	२५४०६	०	०	०.००%	८९.६०%

रकम भुक्तानी हुन नसकेको

कुल योजना संख्या ४, सम्पन्न संख्या ३ शुरु नभएको संख्या १, सम्पन्न ३ वटै योजनाको रकम भुक्तानी हुन नसकेको

तयार गर्ने:

चेक गर्ने

प्रमाणित गर्ने:

रिजेश उपरकोटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चालित योजनाहरूको प्रगति विवरण (गाउँपालिका स्तर)

क.स.	आयोजनाको नाम	ठेकेदार / उभोस अध्यक्ष		आयोजनाको लागत		वार्षिक लक्ष्य	ला. जनसंख्या	आयोजनाको मूल्यांकन अंक	आयोजनाको भुक्तानी अंक	कार्य उपलब्धी	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
		नाम	हम्पक नं.	विनियोजित अनुदान	श्रमदान / ओभर लागत अनुमान							
१	बडा नं. ८ को कार्यालय भवन निर्माण	खनिज मल्टीकन्स्ट्रक्शन		९९५५७६९.४८	०.००	गण्डकी प्रदेश, नेपाल गण्डकी प्रदेश, १० कोठे भवन		७८४७९९६.०८	७८४७९९६.९	३ तल्ला, १० कोठे भवन	७८.८२%	७८.८२%
२	कानिका बुबा स्लब भवन निर्माण	मेघ बहादुर थापा	१८१३५२२०९०३	५०००००.००	५५७७६.९६	५५५७७६.९६ भवन १	५००	५५५९८६.९६	५५५९८६.२९	भवन १	९९.८९%	९९.८९%
३	नयाँगाउँ खेलकुद मैदान निर्माण	जितेन्द्र रसाइली	१८४०५३७५५५	५०००००.००	५५२७९.६७	ग्याबिन जाली १.५*१*१ बक्स ३२ वटा, २*१*१ बक्स २७ वटा	२००	५५४८६४.५	५९०६२९.६९	१.५*१*१ बक्स ३२ वटा, २*१*१ बक्स २७ वटा	९८.९२%	९८.९२%
४	बडा नं. ९ को कार्यालय भवन निर्माण			७२०००००.००	०.००			०.००	०.००		०.००%	०.००%
५	शहिद स्मृती पार्क			२००००००.००	०.००			०.००	०.००		०.००%	०.००%
६	हाइक्विट ट्रेल निर्माण बेनीगाउँ भैरवी पातिश्वोरा			५०००००.००	०.००			०.००	०.००		०.००%	०.००%
७	दत्तभन्ज्याङ हुदै चैसुर लाङ्गालीचोक सडक निर्माण	युका कन्स्ट्रक्शन	१८४५३८६५५१	१००००००.००	१८९.८१	२३ र मि ग्याबियन जाली भर्ने काम	२५००	९९०२९०.४	९९०२९०.४	२३ र मि ग्याबियन जाली भर्ने काम	९९.०२%	९९.००%
८	सिउरेनीटार धुर्ते डाँडा तोरीबोरा बेनीगाउँ सडक	नानीराम श्रेष्ठ	१८१४९८४९५३	१८०००००.००	२०००२६.४८	पहिरो सफा, ग्याबिन पर्खाल, चट्टान काट्ने	१०००	१९९८८५५.८८	१७९८९४६.९९	पहिरो सफा, ग्याबिन पर्खाल, चट्टान काट्ने	९९.९४%	९९.९४%
९	फिस्लिङ गोर्दी सडक निर्माण	तुल बहादुर गुरुङ	१८२४२०२२०९	१००००००.००	१११९११.८४	६०० मि नया दयाक	२७०	११०५१५३.३६	११३९२९.६६	६०० मि नया दयाक	९९.३९%	९९.३९%
१०	सिमल्टार हुदै बडा नं. ७ सम्म सडक	आलोक विन्डर्स एण्ड सप्लायर्स		१००००००.००	-७७५.६१	नाला २२.५० मि ह्यूम पाइप ३ पक्की स्ल्याब १	३५००	९४२४४०.९४	९४२४४०.९४	नाला १५ मि ह्यूम पाइप २ पक्की स्ल्याब १	९४.२४%	९४.३२%
११	रानीबोरा सभाहल सुरक्षा पर्खाल निर्माण	घन बहादुर थापा	१८१५९७९६४९	५०००००.००	५६४७७.०७	३२.३८ मि.	५९४	५५६२४४.८२	५९९७९९.३२	३२.३८ मि लम्बाइको पर्खाल	९९.९६%	९९.९६%
१२	आँपचौर हुदै हवल सडक मर्मत	एस एण्ड एस कन्स्ट्रक्शन	१८५६०४०८२४	५०००००.००	९५.९३	१५ मि. ग्याबियन जाली भर्ने कार्य	२२००	४६४९६०.८	४६४९६०.८	१५ मि. ग्याबियन जाली भर्ने कार्य	९२.९९%	९२.९७%

रिजेश्वर परकोटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१३	तन्त्रो सिम्ले देखि बाधिल्लो सिम्ले सिडि	जगन्नाथ खनाल	१८०४१९९३९	२५००००.००	२८१२४.६२	१९८ मि. सिडि माटो	७५०	२७७२९५.०८	२४९२२१.९९	१९८ मि. सिडि माटो निर्माण	९९.६९%	९९.७०%
१४	कुवापानी देखि अर्वालागार्ड सिडि निर्माण	भक्त बहादुर गुरुङ	१८२५१००७७	२५००००.००	२८०८२.२७	१६२ मि. सिडि माटो	३५०	२७५७६२.१८	२४७९१४.२१	१६२ मि. सिडि माटो निर्माण	९९.१७%	९९.१७%
१५	बान्तर मुलविहि मुहान तटबन्धन	सिद्ध कामना सप्पावर्ष		३०००००.००	-११५.३०	जाली ३ मि. माटो पूर्ण	२६०	२८४१४३.७	२८४१४३.७	जाली ३ मि. माटो पूर्ण	९४.७९%	९४.७५%
१६	लोसार डाँडा घेराबार सैचालय निर्माण	अर्जुन गुरुङ	१८४३३२५७८	४०००००.००	४५००७.५५	४४५००७.५५	८७ मि. जाली राख्ने	२५००	४३४९२९.१३	८७ मि. जाली राखिएको	९७.७४%	९७.७४%
१७	मुन्धला भन्डार परिचद् मन्च निर्माण	राम कुमार श्रेष्ठ	१८०८६०१६२६	४०००००.००	४४३४२.९९	४४४३४२.९९	१ कोठे ट्रेस भवन, मंघ	७५०	४४२६६४.०५	१ कोठे ट्रेस भवन, मंघ	९९.६२%	९९.६२%
१८	कालिका बुवा स्तम्भ भवन निर्माण बडा नं ४	दिपक भट्ट	१८२६१२६५६२	४०००००.००	४६५६९.३८	४४६५६९.३८	भवन १	२२०	४०३३५७.४६	भवन १	९०.३२%	९०.३२%
१९	टिमुरीखोला खापा मर्मत	नारायण प्रसाद देवकोटा	१८०४१९६३७	१०००००.००	११३६४.९९	१११३६४.९९	खानेपानी ट्याकी १, सिडि ८.३५ मि. सिडि	१००	१०७११३.५२	खानेपानी ट्याकी १, सिडि ८.३५ मि. सिडि	९६.१८%	९६.१८%
२०	कुवापानी सामुदायिक भवन निर्माण	बिन्दु कुमारी अर्वाला	१८४३२९७८३३	४०००००.००	४५६४०.४९	४४५६४०.४९	भवन १	२००	४४४०९६.९७	भवन १	९९.६५%	९९.६५%
२१	सिम्ले आमडाँडा सडक निर्माण	बिष्णु ढकाल	१८१८४५३५३७	५०००००.००	५५८४७.६८	५५५८४७.६८	कजवे १	१२००	५५१४२३.२५	कजवे १	९९.२०%	९९.२०%
२२	भोतुपुल मर्मत	देवराज रेग्मी	१८१८७३३०९	२०००००.००	-८८८०८.६२	११११११.३८	भो पु १	५००	७०७६८.७५	भो पु १	३१.८२%	६३.६५%
२३	रेडक्स भवन मर्मत	अमृत भुजेल	१८१०२७३६९	१५००००.००	१६८३९.९५	१६६८३९.९५	फल सिल्लिंग, पेंटिंग,	३०००	१६३७५१.५३	फल सिल्लिंग, पेंटिंग,	९८.१४%	९८.१४%
२४	बैड गुम्वा तथा पर्खाल निर्माण	राम बहादुर गुरुङ	१८२३५३४६३६	३०००००.००	३३३७४.१४	३३३७४.१४	१ कोठे भवन, पर्खाल, प्लास्टर, बिधुत	३०५	३३३४६६.८४	१ कोठे भवन, पर्खाल, प्लास्टर, बिधुत	१००.००%	१००.०३%
२५	तोमनडाँडा मा.वि भवन मर्मत	गुप्पा एण्ड अनिष विन्डर्स	१८४५३८६५४१	७७७७४२.७८	०.००	७७७७४२.७८	भवन १	५००	७३८२३१.४७	भवन १	९४.९२%	९४.९२%
२६	असल साथी सहकारी भवन मर्मत	नारायण प्रसाद न्यौपाने	१८६४२९१३५९	३०००००.००	३४३१३.२२	३३४३१३.२२	भवन १	१५००	३३३४६४.६६	भवन १	९९.७५%	९९.७५%
२७	भैरवधान जाने सिडि निर्माण	प्रविण श्रेष्ठ	१८२५२१८२९६	३०००००.००	३३७३०.९९	३३७३०.९९	१३० मि. सिडि निर्माण	१९५	३३३७०१.४७	१३०.५ मि. सिडि	९९.९९%	९९.९९%
२८	अर्चनवास देखि वालकी आ.वि. सिडि निर्माण	दर बहादुर थापा	१८२९११६२६६	२०००००.००	२२२२३.००	२२२२३.००	पक्की सिडि २७८ मि.	३००	१८३२७८.६१	११६.२० मि.र वाटो खन्ने काम ५७९.७ मि.	८२.४८%	८२.४८%

रिजेस कोटी
महानगरपालिका अधिकृत

२९	समानता कृषि महिला समूह भवन निर्माण	विनु थापा	९८१०५१६३२७	८०००००.००	८८९६८.६६	८८९६८.६६	भवन १	२००	८८७३०४.३७	७९८५०२.२६	भवन १	९९.८१%	९९.८१%
३०	५ नं. बडा कार्यालय घोरावारी	उज्जवल निर्माण सेवा		४०००००.००	३३५६६.३७	३३५६६.३७	५७ मि. लम्बाइको बालको भाग तयारी	१५	३८७७९.०९	३८७७९.०९	५७ मि. लम्बाइको बालको भाग तयारी	९६.७९%	९६.८८%
३१	धारापानी देबि अधिकारी गार्डसम्म सिडि बाटो निर्माण	दिनेश अधिकारी	९८६९८२७५२८	५०००००.००	५५५५५.९२	५५५५५.९२	३३६ मि. सिडि निर्माण गर्ने	१५००	५५५६२५.७३	४९९९६३.५५	३३६ मि. सिडि निर्माण गर्ने	९९.८३%	९९.८३%
३२	खल्टुपानी अधिकारी टोल सम्म सिडि निर्माण	जुन बहादुर थापा	९८०६७६५२८५	५०००००.००	७०५५७.२६	५७०५५७.२६	३५३ मि. सिडि निर्माण गर्ने	१००	५६७२०३.७५	४९७०६९.२	३५३ मि. सिडि निर्माण गर्ने	९९.४९%	९९.४९%
३३	मखमली कृषि आमा समूहको शिव मन्दिर निर्माण	विमला श्रेष्ठ	९८४९३७९९६७	५०००००.००	५५५९९.३३	५५५९९.३३	मन्दिर १	२२०	५४६५०९.०७	४९९८२६.४९	मन्दिर १	९८.३७%	९८.३७%
३४	जलदेवी महिला समूह भवन निर्माण	अम्बिका तिवारी	९८६३४४२२६८	५०००००.००	५५९८७.००	५५५९८७.००	भवन १	२५०	५५५७५६	४९९७९२.२६	भवन १	९९.९६%	९९.९६%
३५	गन्टार महिला भवनबाट डाहल गार्ड सिडि निर्माण		९८५९९९२२४९	५०००००.००	५६२६८.६९	५५६२६८.६९	२९२.४ मि सिडि निर्माण गर्ने	५००	५५९६२७.०९	४९४०३०.२२	२९२.४ मि सिडि निर्माण गर्ने	९८.८९%	९८.८९%
३६	भेडावारी ऐना पहाड भलायडाडा गोर्दि बाटो स्तरोन्नती	दिवस थापा	९८२९४९९८५४	७०००००.००	७८५५९.०९	७७८५५९.०९	१७.५५ मि. टेवा पर्खाल, सडक विस्तार २७८ मि., २२० मि. कच्ची नाला, २५.५ घमि ग्यावियन जाली	७४०	७७७९२२.८९	६९८७९५.९	पर्खाल, सडक विस्तार २७८ मि., २२० मि. कच्ची नाला, २५.५ घमि ग्यावियन जाली	९९.८२%	९९.८२%
३७	चेपाङ्ग सङ्ग्रहालय भवन निर्माण	महादेव भैरवी कन्स्ट्रक्शन	९८५६०३४९०९	१००००००.००	-९५३४.३७	९९८४६५.६३	भवन १	४५००	९५०९२३.९६	९५०९२३.९६	भवन १	९५.०९%	९५.२४%
३८	मुन्यला मन्दिर निर्माण	भिजन कन्स्ट्रक्शन	९८४६०२७८९५	१७०००००.००	४२९२९२.६३	२९२९२९२.६३	मन्दिर १	३५००	९७७०८५.९३	९७७०८५.९३	मन्दिर १	५७.४८%	४६.०६%
३९	भैरवी मन्दिर निर्माण	सासा कन्स्ट्रक्शन		४५०००००.००	-७५५९३.९५	४४२५४८६.०५	मन्दिर १	३५००	३२८३८३९.७३	३२८३८३९.७३	मन्दिर १	७२.९७%	७४.२०%
	जम्मा			४३२८३५९३.२६	९६४८४९.७०	४४९२५३५३.९६			३०४९९७७.४४	२९०४९७५३.०३		६७.९०%	६७.७९%

पुर्वाधार तर्फ कुल योजना संख्या ३९, सम्पन्न ३६, सुरु नभएको ३ निर्माणार्थिन ०

तयार गर्ने

चेक गर्ने

प्रमाणित गर्ने

रिजेश उपरकोटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालित योजनाहरूको प्रगति विवरण (वडा नं. १)

क्र.स.	आयोजनाको नाम	ठेकेदार / उभोस अध्यक्ष		आयोजनाको लागत			ला. जनसंख्या	आयोजनाको मूल्यांकन अंक	आयोजनाको भुक्तानी अंक	कार्य उपलब्धी भौतिक विवरण	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	मौलिक प्रगति प्रतिशत
		नाम	सम्पर्क नं.	विनियोजित अनुदान	श्रमदान	कुल लागत अंक						
१	साँक्रुछाप पल्लो नियन्त्रण	पदम कुमार श्रेष्ठ	९८१८२४७५२	१०००००.००	१५६८३.६८	११५६८३.६८	४०	११५०७५.६०	९९४७४.३६	२१.११ को १० घान	९९.४७%	९९.४७%
२	कोलडाँडा पल्लो नियन्त्रण	केशर चेपाङ	९८१०११९३७१	१०००००.००	११८७१.७३	१११८७१.७३	५२	१०७१२७.८३	९५७५९.५२	१.५११ को १३ घान	९५.७६%	९५.७६%
३	बुटार डोणगाउँ पन्थार खानेपानी तथा कुनो मर्मत	द्योमन सुनार	९८०९२१२९९९	३५००००.००	३८११६.८६	३८८११६.८६	८००	३८४८८७.९६	३४७०८८.२१	आरम्भ १, हलुम पाइप ३, ३७० मि. कुनो	९९.१७%	९९.१७%
४	बन्जरे सडक निर्माण	सुपारे प्रजा	९८०५१३८८३२	२५००००.००	२७८९५.४२	२७७८९५.४२	४४	२७५५०२.२७	२४७८४७.०८	९९० मि. बाटो सफा तथा स्तरोन्नती	९९.१४%	९९.१४%
५	पिपलछाप बिजबा भवानी र खन्तुपानी पैदल मार्ग निरन्तरता	सोम बहादुर गुरुङ	९८४१०१५६८३	१०००००.००	१२३५२.९३	११२३५२.९३	९०	१०९८७८.४८	९७७९७.६१	५९ मि. सिडि बाटो निर्माण	९७.८०%	९७.८०%
६	बलेनीधारा साँक्रुछाप पैदल मार्ग	अमृत राना	९८१८५७५४४८	१५००००.००	१६७८६.६९	१६६७८६.६९	११३	१६१३२३.००	१४५०८६.२२	१२० मि. सिडि निर्माण	९६.७२%	९६.७२%
७	बाइधुर र कोलडाँडा खानेपानी योजना	सुन बहादुर चेपाङ	९८१०३८४२८४	२५००००.००	२७६६६.५०	२७७६६६.५०	९९	२७४६६६.००	२४७२९८.४७	पाइप ४१४० र.मि. पाइप खरिद, ४ बटा धारा निर्माण	९८.९२%	९८.९२%
८	मधुवन सडक निर्माण योजना	मेक बहादुर चेपाङ	९७४८७५७७४	१५००००.००	१६८१७.२२	१६६८१७.२२	८०	१६३५०७.९५	१४७०२४.३४	नया ट्याक ४९० मि. बाटो	९८.०२%	९८.०२%
९	तल्लो जटार देखि प्रजा बस्ती प्रा.वि. पैदल मार्ग	एक बहादुर चेपाङ	९८०४१२०९४७	१०००००.००	१४६२१.३७	११४६२१.३७	८५	११४२३१.१२	९९६५९.५३	५७ मि. सिडि	९९.६६%	९९.६६%
१०	साँक्रुछाप बाधारा र गैरा घर पैदल मार्ग	जनक बहादुर श्रेष्ठ	९८४१५०८९१४	१५००००.००	१८८२७.९८	१६८८२७.९८	७२०	१६४५६४.९२	१४६२१२.३६	९४ मि. सिडि निर्माण	९७.४७%	९७.४७%
११	बुटार देखि डोणगाउँ गोरेटोबाटो मर्मत	याम बहादुर चेपाङ	९८१५२८०८३४	२०००००.००	२२२२३.००	२२२२२३.००	१२४८	२२१५४२.००	१९९३८७.१०	३५३.१ मि. सिडि बाटो	९९.६९%	९९.६९%
१२	जटार चर्च घर घेरावार	निर्मल चेपाङ	९७४९७३०४६७	२०००००.००	२२८९९.६९	२२२८९९.६९	१०५	२१४५८६.८४	१९२५१४.१७	२९.५० मि. घेरावार	९६.२६%	९६.२७%
१३	जागृति कृषि महिला समूह भवन निर्माण	नन्द कुमारी अधिकारी	९८४९६१२००४	२०००००.००	२२८६८.२०	२२२८६८.२०	२००	२२१८५५.२७	१९९०९१.००	भवन १	९९.५५%	९९.५५%
१४	बाँधुर खोला पल्लो नियन्त्रण	लालु माया चेपाङ	९८०२९६७२८९	१५००००.००	१६६६७.००	१६६६६७.००	४००	१६४२५४.००	१४७८२८.३०	५२ घान जाली	९८.५५%	९८.५५%
१५	धुसेनी सडक निर्माण योजना	शक्ति श्रेष्ठ	९८४०६६७४७८	१५००००.००	१६९५५.७५	१६६९५५.७५	१२५	१६५८५६.६५	१४९०१२.५२	१८.९० मि. पर्बाल	९९.३४%	९९.३४%

रिजेश उपरकोटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
